

# Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Sumár zmenových listov č.1

Objednávateľ : PKV

Projektant : EXPO LINE s.r.o.

Zhotoviteľ : Milanko spol. s r.o.

TDI : Pallas s.r.o.

P.č.	Názov ZL	naviac práca, dodávka	menej práca dodávka	skutočne práce naviac
ZL1	Prestup strechy HP	1 209,80 €	0,00 €	1 209,80 €
ZL2	Svietidlá detsky pavilón	1 516,20 €	-1 620,00 €	-103,80 €
ZL3	Svietidla hlavný pavilón	5 924,98 €	-8 885,00 €	-2 960,02 €
ZL4	Kazet. podhlad detsky pavilón	1 135,68 €	-957,60 €	178,08 €
ZL5	Kazet. podhlad hlavný pavilón	8 567,62 €	-7 097,44 €	1 470,18 €
ZL6	Zriadenie ostenia dverí	6 669,79 €	0,00 €	6 669,79 €
ZL7	Šachtová stena	3 876,53 €	0,00 €	3 876,53 €
ZL8	Automatické dvere	1 111,56 €	0,00 €	1 111,56 €
ZL9	Požiarne klapky	3 088,30 €	-300,00 €	2 788,30 €
ZL10	Podchytenie otvoru	814,37 €	0,00 €	814,37 €
Spolu naviac práce,dodávky		33 914,83 €		
Spolu menej práce , dodávky			-18 860,04 €	
<b>Sumár zmenových listov č.1</b>				<b>15 054,79 €</b>

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Projekt	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
ELZ číslo	<b>01</b>	Zmluva o dielo	
Objednávateľ	PKV	Zodpovedný	Ing. Silvia Némethová
TDI	Pallas s.r.o.,	Zodpovedný	Ing. Patrik Palaj
Projektant	EXPO LINE s.r.o.	Zodpovedný	Ing. Soňa Borsová
Zhotoviteľ	Milanko spol. s r.o.	Zodpovedný	Ing. Miroslav Vilík
Predmet zmeny	Strešný prestup		
Stavebný objekt, miesto	Strecha hlavného objektu		
Žiadosť o zmenu vzniesol	a) Zhotoviteľ b) Investor		
Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
Odkaz na inú časť ZoD			
Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)	Nepredvídaná práca + navyše práce ( výmena dažďového zvodu v streche)		
Vyjadrenie projektanta	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
Vyjadrenie zhotoviteľa	Zhotoviteľ požaduje uhradiť navyše práce spojené s nepredvídanou prácou pri prestupoch z hlavnej vetracej šachty a z ňou spojenou dažďovou kanalizáciou		
Vyjadrenie TDI			
Vyjadrenie zástupcu investora			
Časové hodnotenie	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie		
Dopad do zmluvných termínov	Navyše práce nemala vplyv na zmluvné termíny		

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Položkový rozpis nákladov	vid' príloha č. 1
Celkové náklady zmeny bez DPH	1209,80 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Prestup strechy	

<b>Potvrdenie zmeny</b>			
Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.			
Zhotoviteľ	VILK	Podpis	Dátum
Projektant	BORSOVÁ	Podpis	Dátum
TDI		Podpis	Dátum
Objednávateľ		Podpis	Dátum

<b>Rozdeľovník</b> PKV, Ing. Silvia Némethová PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík
<b>Použité skratky</b>  VV – výkaz výmer PD – projektová dokumentácia ZL – zmenový list ELZ – evidenčný list zmeny ZoD – zmluva o dielo TDI – technický dozor investora J.C. – jednotková cena SO – stavebný objekt AD – autorský dozor

# Rozpočet Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení (viac / 1. prestup strechy

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves

Spracoval: Šteinerová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Dátum: 9. 9. 2020

Zákazka Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - navyč

Objekt 1. prestup strechy



## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1/A 1	411000000	Podbebnenie priestoru	m2	1,500	25,00	0,00	37,50		0	
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	999000000	Otvorenie strechy	m2	2,000	15,50	0,00	31,00		0	
13/B 1	969011131	Vybúranie - demontáž odvetrávacích potrubí liatinových	ks	4,000	17,00	0,00	68,00		0	0,148
13/B 1	969000000	Demontáž plastovej vpuste	ks	1,000	11,90	0,00	11,90		0	
13/B 1	969000000	Demontáž pôvodného a liatinového odvetrávacieho potrubia DN 110 + uloženie na skládku	ks	3,000	27,60	0,00	82,80		0	
13/B 1	969000000	Demontáž liatinovej vpuste	ks	1,000	14,00	0,00	14,00		0	
3/B 1	978065021	Demontáž tepelnej izolácie striech hr. 300 mm	m2	1,500	2,60	0,00	3,90		0	0,028
13/B 1	963051110	Búranie otvoru v železobetónových stropoch	m3	0,100	280,00	0,00	28,00		0	0,240
11/A 1	952901111	Výčistenie zasiahnutého priestoru od stojatej vody	kpl	1,000	20,00	0,00	20,00	0,000	0	
11/A 1	952901111	Výčistenie priestoru strechy doprava sute, uloženie na skládku	kpl	1,000	50,00	0,00	50,00	0,000	0	
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>309,60</b>		<b>0,000</b>	<b>0,42</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>347,10</b>		<b>0,000</b>	<b>0,42</b>
		<b>Práce PSV</b>								
712		<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>								

Rozpočet Polikár: a Karlova Ves - Rekonštrukcia socialnych zariadení - viac / 1. prestup strechy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
712	712000000	dodávka a montáž povlakové krytiny strechy	m2	2,000	22,60	0,00	45,20		0	0
	<b>712</b>	<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>			<b>45,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								
713	713000000	Spätná montáž tepelnej izolácie strechy hr. 300 mm	m2	1,500	3,00	0,00	4,50		0	0
713	713000000	Späná montáž izolácie, doplnenie izolácie , vypnenie priestoru	1kpl	1,000	30,00	0,00	30,00		0	0
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>721</b>	<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>								
721	721000000	M+D - odvetravacie komínky	kpl	4,000	29,00	0,00	116,00		0	0
721/A 1	721230072	M+D - plastová strešná vpusť	kpl	1,000	45,00	0,00	45,00		0	0
721	721000000	M+D - založenie strešných šálov na potrubie	kpl	4,000	118,00	0,00	472,00		0	0
722	722000000	Výrezanie pôvodného potrubia odvetrávacieho DN 110	ks	1,000	150,00	0,00	150,00		0	0
	<b>721</b>	<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>			<b>633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
1/A 1	999000000	dopravné náklady	kpl	1,000	150,00	0,00	150,00		0	0
		<b>Práce PSV</b>			<b>862,70</b>	<b>0,00</b>	<b>862,70</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>1 209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209,80</b>		<b>0,000</b>	<b>0,42</b>

01 F Prestup strechy

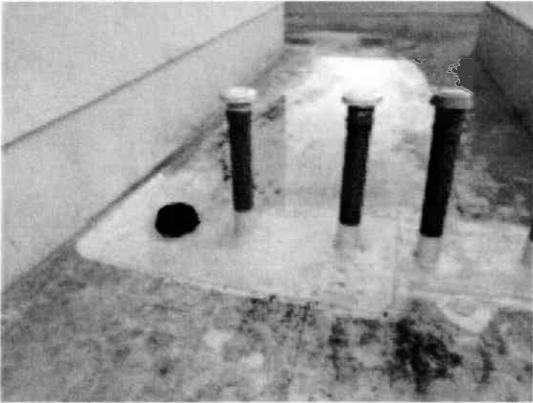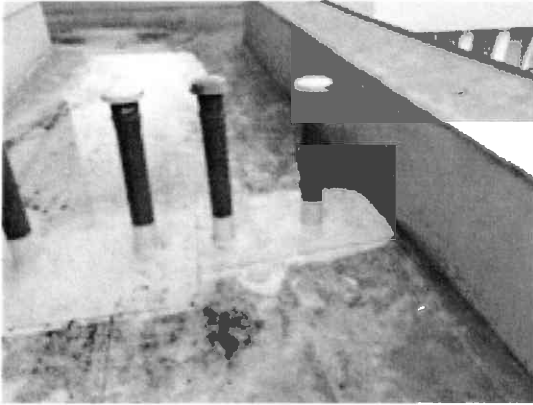

**ELZ - Evidenčný list zmeny**



<b>Projekt</b>	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
<b>ELZ číslo</b>	<b>02</b>	<b>Zmluva o dielo</b>	
<b>Objednávateľ</b>	PKV	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Silvia Némethová
<b>TDI</b>	Pallas s.r.o.,	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Patrik Palaj
<b>Projektant</b>	EXPO LINE s.r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Soňa Borošová
<b>Zhotoviteľ</b>	Milanko spol. s r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Miroslav Vilík
<b>Predmet zmeny</b>	Zámena svietidiel DP		
<b>Stavebný objekt, miesto</b>	1.02 – 1.11 , 2.02 - 2.11		
<b>Žiadosť o zmenu vznesol</b>	a) Zhotoviteľ b) Investor		
<b>Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)</b>	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
<b>Odkaz na inú časť ZoD</b>			
<b>Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)</b>	Menšia pravdepodobnosť odcúdenia ( návaznosť na zmenu v riešení stropu.		
<b>Vyjadrenie projektanta</b>	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa</b>	Zhotoviteľ požaduje uhradiť vzniknutú zámenu svietidiel. Z ceny diela budú odrátané pôvodné svietidla.		
<b>Vyjadrenie TDI</b>			
<b>Vyjadrenie zástupcu investora</b>			
<b>Časové hodnotenie</b>	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie		
<b>Dopad do zmluvných termínov</b>	Zmen nemala vplyv na zmluvné termíny		

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Položkový rozpis nákladov	vid' príloha č. 1
Celkové náklady zmeny bez DPH	1516,20 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Svietidlá DP	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

Zhotoviteľ		Podpis	Dátum	
Projektant		Podpis	Dátum	
TDI		Podpis	Dátum	
Objednávateľ		Podpis	Dátum	


### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borošova  
Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík

### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
PD – projektová dokumentácia  
ZL – zmenový list  
ELZ – evidenčný list zmeny  
ZoD – zmluva o dielo  
TDI – technický dozor investora  
J.C. – jednotková cena  
SO – stavebný objekt  
AD – autorský dozor

02F\_ Svietidlá detský pavilón

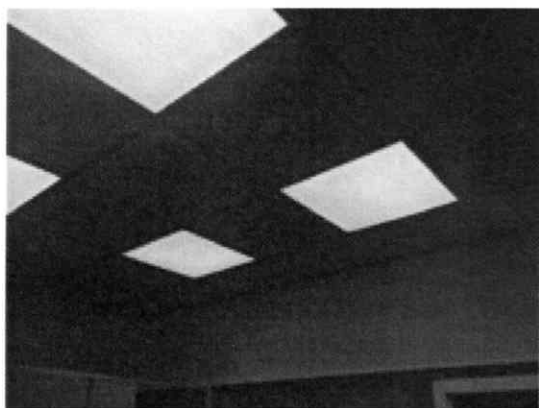

**Stavba:** POLIKLINIKA KARLOVA VES - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ  
**Investor :** Poliklinika Karlova Ves  
**Dodávateľ :** Milanko spol. sr.o.  
**Objekt :** Hlavný objekt Polikliniky  
**Časť :** Zámena svietidiel DP / Elektroinštalácia

Por.č.	Popis položky	M.J.	Množstvo	J.C.	Spolu
1	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	24	42,58 €	1021,92
2	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20 225 x 31(výška)mm Biela farba, opál	ks	4	28,79 €	115,16
3	Montáž kazetového svietidla + prisadeného	ks	28	10,83 €	303,24
4	M+D inštaláčnej krabičky A11(OBO Beterman)	ks	28	2,71 €	75,88
<b>Spolu</b>					<b>1516,20</b>

**Menej dodávka, práca**

17	Montáž svietidiel do podhľadu	ks	36	-15,00 €	-540,00
S002	Svietidlo kruhové, zapustené, typu downlight, LED, aPTS, veľkosť S, 1x19W, predradník ECG FIX, lm 2000, 4000K, Ra 80, IP 40, matt reflektor, farba RAL 9003	ks	32	-30,00 €	-960,00
S013	Svietidlo kruhové, prisadené, typu downlight, LED, aPTS, veľkosť S, 1x19W, predradník ECG FIX, lm 1750, 4000K, Ra 80, IP 40, matt reflektor, farba RAL 9003	ks	4	-30,00 €	-120,00
<b>Spolu</b>					<b>-1620,00</b>

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Projekt	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
ELZ číslo	<b>03</b>	Zmluva o dielo	
Objednávateľ	PKV	Zodpovedný	Ing. Silvia Némethová
TDI	Pallas s.r.o.,	Zodpovedný	Ing. Patrik Palaj
Projektant	EXPO LINE s.r.o.	Zodpovedný	Ing. Soňa Borsová
Zhotoviteľ	Milanko spol. s r.o.	Zodpovedný	Ing. Miroslav Vilík
Predmet zmeny	Zámena svietidiel HP		
Stavebný objekt, miesto	Všetky priestory okrem priestoru 1.33,1.34		
Žiadosť o zmenu vznikla	a) Zhotoviteľ b) Investor		
Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
Odkaz na inú časť ZoD			
Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)	Menšia pravdepodobnosť odcúdzania ( návaznosť na zmenu v riešení stropu.		
Vyjadrenie projektanta	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
Vyjadrenie zhotoviteľa	Zhotoviteľ požaduje uhradiť vzniknutú zámenu svietidiel. Z ceny diela budú odrátané pôvodné svietidla.		
Vyjadrenie TDI			
Vyjadrenie zástupcu investora			
Časové hodnotenie	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie		
Dopad do zmluvných termínov	Zmena nemala vplyv na zmluvné termíny		

## ELZ - Evidenčný list zmeny

<b>Položkový rozpis nákladov</b>	viď príloha č. 1
<b>Celkové náklady zmeny bez DPH</b>	5924,98 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Svietidla HP	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

<b>Zhotoviteľ</b>	VILK	<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>Projektant</b>	BORSOVÁ	<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>TDI</b>		<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>Objednávateľ</b>		<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>

### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová  
Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík

### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
PD – projektová dokumentácia  
ZL – zmenový list  
ELZ – evidenčný list zmeny  
ZoD – zmluva o dielo  
TDI – technický dozor investora  
J.C. – jednotková cena  
SO – stavebný objekt  
AD – autorský dozor

Stavba: POLIKLINIKA KARLOVA VES - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Investor : Poliklinika Karlova Ves

Dodávateľ : Milanko spol. sr.o.

Objekt : Hlavný objekt Polikliniky

Časť : Zámena svietidiel HP/ Elektroinštalácia




Por.č.	Popis položky	M.J.	Množstvo	J.C.	Spolu
	<b>1PP</b>				
1	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	18	42,58	766,44
2	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	5	28,79	143,95
	<b>1NP</b>				
3	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	15	42,58	638,7
4	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	2	28,79	57,58
5	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	2	28,79	57,58
	<b>2NP</b>				
6	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	14	42,58	596,12
7	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	2	28,79	57,58
	<b>3NP</b>				
8	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	14	42,58	596,12
9	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	2	28,79	57,58
	<b>4NP</b>				
10	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	17	42,58	723,86
11	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	2	28,79	57,58
12	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	1	28,79	28,79
	<b>5NP</b>				
13	Kazetové svietidlo LED panel 38,5W 3800lm 4000K CRI>80 IP20 595 x 595 mm Biela farba	ks	14	42,58	596,12
14	Prisadené svietidlo LED2 EASY-R ON, L 2190841 18W 1620lm 4000K CRI>80 IP20	ks	2	28,79	57,58
15	Montáž kazetového svietidla + prisadeného	ks	110	10,83	1191,3
16	M+D inštaláčnej krabičky A11(OBO Beterman)	ks	110	2,71	298,1
<b>Spolu</b>					<b>5924,98</b>

**Menej dodávka, práca**

17	Montáž svietidiel do podhľadu	ks	176	-15,00 €	-2640,00
----	-------------------------------	----	-----	----------	----------

<b>S002</b>	<i>Svietidlo kruhové, zapustené, typu downlight, LED, aPTS, veľkosť S, 1x19W, predradník ECG FIX, lm 2000, 4000K, Ra 80, IP 40, matt reflektor, farba RAL 9003</i>	<i>ks</i>	<i>162</i>	<i>-35,00 €</i>	<i>-5670,00</i>
<b>S003</b>	<i>Svietidlo kruhové, zapustené, typu downlight, LED, aPTS, so zvýšeným krytím do vlhkého prostredia, veľkosť S, 1x19W, predradník ECG FIX, lm 1800, 4000K, Ra 80, IP 54, matt reflektor, farba RAL 9004</i>	<i>ks</i>	<i>3</i>	<i>-40,00 €</i>	<i>-120,00</i>
<b>S013</b>	<i>Svietidlo kruhové, prisadené, typu downlight, LED, aPTS, veľkosť S, 1x19W, predradník ECG FIX, lm 1750, 4000K, Ra 80, IP 40, matt reflektor, farba RAL 9003</i>	<i>ks</i>	<i>13</i>	<i>-35,00 €</i>	<i>-455,00</i>
<b>S010</b>	<i>Svietidlo kruhové, zapustené, typu downlight, LED, aPTS, veľkosť S, 1x19W, predradník ECG FIX, lm 2200, 4000K, Ra 80, IP 40, matt reflektor, farba RAL 9003</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>	<i>-30,00 €</i>	<i>-30,00</i>
<b>Spolu</b>					<b>-8885,00</b>

03F\_ Svietidlá HP

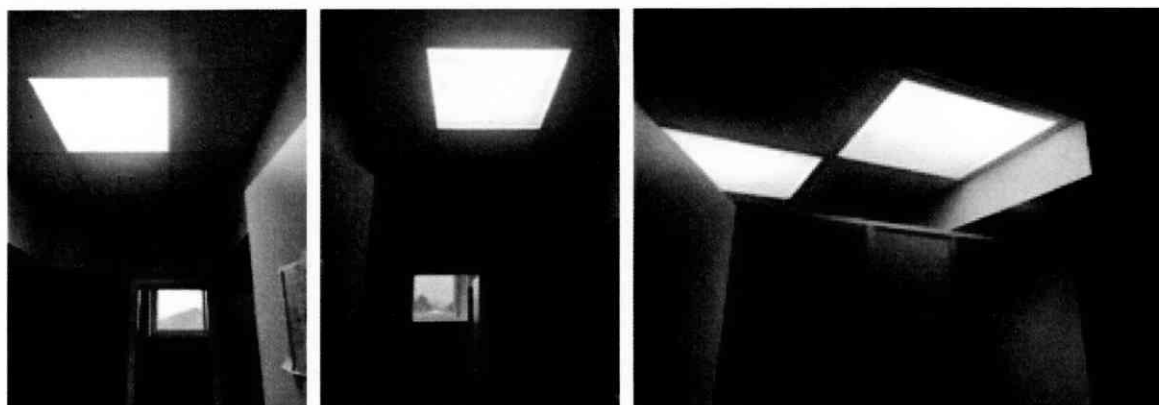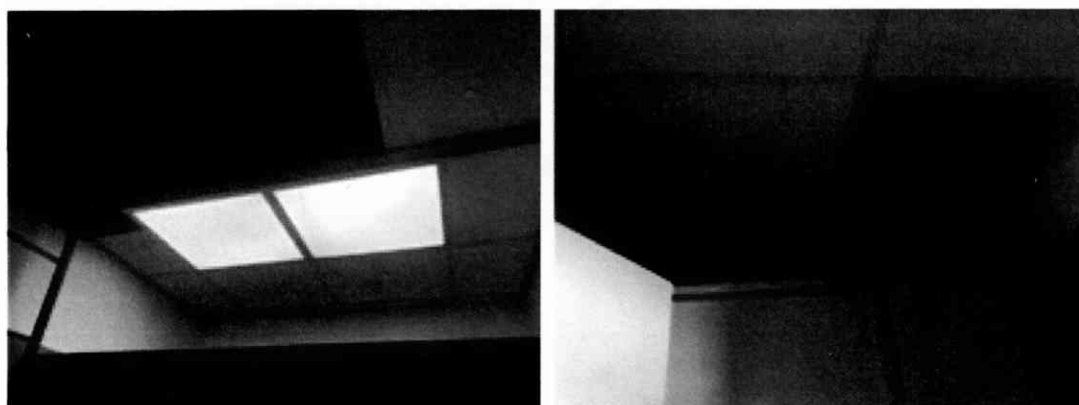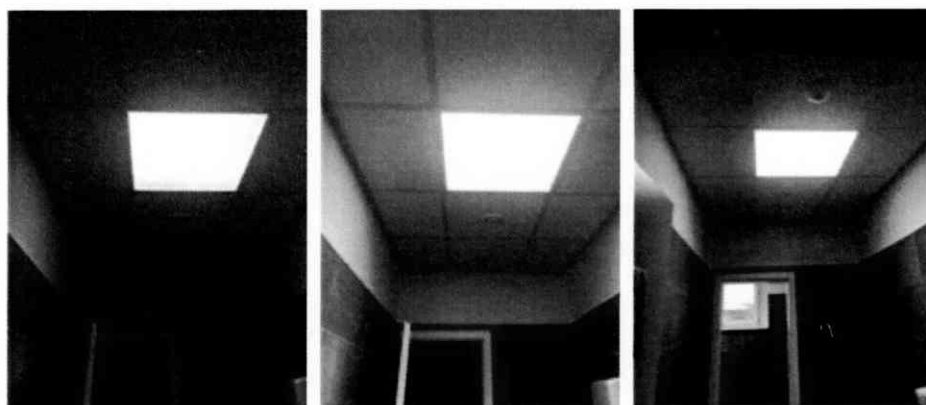



**ELZ - Evidenčný list zmeny**

<b>Projekt</b>	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
<b>ELZ číslo</b>	<b>04</b>	<b>Zmluva o dielo</b>	
<b>Objednávateľ</b>	PKV	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Silvia Némethová
<b>TDI</b>	Pallas s.r.o.,	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Patrik Palaj
<b>Projektant</b>	EXPO LINE s.r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Soňa Borsová
<b>Zhotoviteľ</b>	Milanko spol. s r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Miroslav Vilík
<b>Predmet zmeny</b>	Zmena riešenia podhládov DP		
<b>Stavebný objekt, miesto</b>	Všetky priestory riešené plným SDK		
<b>Žiadosť o zmenu vznesol</b>	a) Zhotoviteľ b) Investor		
<b>Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)</b>	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
<b>Odkaz na inú časť ZoD</b>			
<b>Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)</b>	Z dôvodu lepšieho prístupu a servisu k novým rozvodom vody, eli, vzt ktoré sú na 90 % vedené pod stropom		
<b>Vyjadrenie projektanta</b>	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa</b>	Zhotoviteľ požaduje uhradiť práce spojené z realizáciou kazetového stropu. Náklady na realizáciu SDK stropu budú odrátané.		
<b>Vyjadrenie TDI</b>			
<b>Vyjadrenie zástupcu investora</b>			
<b>Časové hodnotenie</b>	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie		
<b>Dopad do zmluvných termínov</b>	Navyše práca nemala vplyv na zmluvné termíny		

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Položkový rozpis nákladov	vid' príloha č. 1
Celkové náklady zmeny bez DPH	1135,68 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

Zhotoviteľ	VILK	Podpis	Dátum
Projektant	BORSOVÁ	Podpis	Dátum
TDI		Podpis	Dátum
Objednávateľ		Podpis	Dátum

### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová  
Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vílk

### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
PD – projektová dokumentácia  
ZL – zmenový list  
ELZ – evidenčný list zmeny  
ZoD – zmluva o dielo  
TDI – technický dozor investora  
J.C. – jednotková cena  
SO – stavebný objekt  
AD – autorský dozor

Súpis prevedených prác, Rekonštrukcia sociálnych priestorov

Spracoval: Šteinerová

Ks:

Dátum:

Projektant: Ing. Borsová

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves


Zákazka: Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV

Objekt: Zmena riešenia podhládov DP

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce PSV							
	763	DREVOSTAVBY							
	763	763000000 M+D - SDK podhlád kazetový	m2	33,600	33,80		1 135,68		0
	763	DREVOSTAVBY					1 135,68		0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
<b>Spolu práce PSV</b>							<b>1 135,68</b>		<b>0,000</b>
<b>Menej dodávka, práca</b>									
	763	76313-3030 Podhlády sádrokartónové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBL hr. 12,5 mm	m2	33,6	-28,50		-957,60		
<b>Spolu menej dodávka + práca</b>							<b>-957,60</b>		

04 F \_ Kazetový strop DP

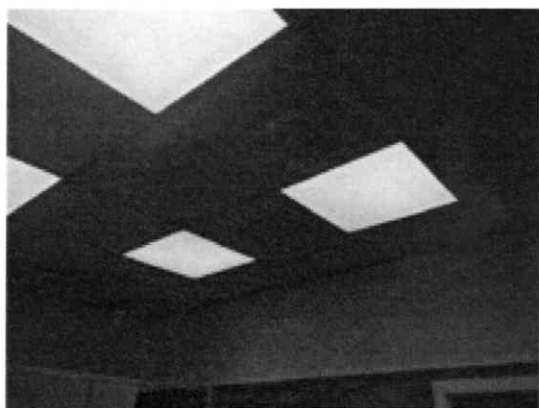

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Projekt	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
ELZ číslo	<b>05</b>	Zmluva o dielo	
Objednávateľ	PKV	Zodpovedný	Ing. Silvia Némethová
TDI	Pallas s.r.o.,	Zodpovedný	Ing. Patrik Palaj
Projektant	EXPO LINE s.r.o.	Zodpovedný	Ing. Soňa Borsová
Zhotoviteľ	Milanko spol. s r.o.	Zodpovedný	Ing. Miroslav Vilk
<b>Predmet zmeny</b>	Zmena riešenia podhľadov HP		
<b>Stavebný objekt, miesto</b>	Všetky priestory riešené plným SDK okrem priestoru 1.33, 1.34		
<b>Žiadosť o zmenu vznesol</b>	a) Zhotoviteľ b) Investor		
<b>Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)</b>	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
<b>Odkaz na inú časť ZoD</b>			
<b>Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. naviac práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)</b>	Z dôvodu lepšieho prístupu a servisu k novým rozvodom vody, eli, vzt ktoré sú na 90 % vedené pod stropom		
<b>Vyjadrenie projektanta</b>	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa</b>	Zhotoviteľ požaduje uhradiť práce spojené z realizáciou kazetového stropu. Náklady na realizáciu SDK stropu budú odrátané.		
<b>Vyjadrenie TDI</b>			
<b>Vyjadrenie zástupcu investora</b>			
<b>Časové hodnotenie</b>	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie		
<b>Dopad do zmluvných termínov</b>	Naviac práca nemala vplyv na zmluvné termíny		

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Položkový rozpis nákladov	vid' príloha č. 1
Celkové náklady zmeny bez DPH	8567,62 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	



<b>Potvrdenie zmeny</b>			
Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.			
Zhotoviteľ	VILK	Podpis	Dátum
Projektant	BORSOVÁ	Podpis	Dátum
TDI		Podpis	Dátum
Objednávateľ		Podpis	Dátum


<b>Rozdeľovník</b> PKV, Ing. Silvia Némethová PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík
<b>Použité skratky</b> VV – výkaz výmer PD – projektová dokumentácia ZL – zmenový list ELZ – evidenčný list zmeny ZoD – zmluva o dielo TDI – technický dozor investora J.C. – jednotková cena SO – stavebný objekt AD – autorský dozor

Súpis prevedených prác, Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Projektant: Ing. Borsová Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves Zákazka: Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV Objekt: Zmena riešenia podhľadov HP		Spracoval: Steinerová Ks: Dátum:							
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce PSV							
	763	DREVOSTAVBY							
	763	763000000 M+D - SDK podhľad kazetový	m2	253,480	33,80		8 567,62		0
	763	DREVOSTAVBY					8 567,62		0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
<b>Spolu práce PSV</b>							<b>8 567,62</b>		<b>0,000</b>
Menej práce dodávky									
	763	76313-3030 Podhlady sádrokartónové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RfI hr. 12,5 mm	m2	253,48	-28,00		-7 097,44		
<b>Spolu menej doávka + práca</b>							<b>-7 097,44</b>		

05F \_ Kazetový strop HP

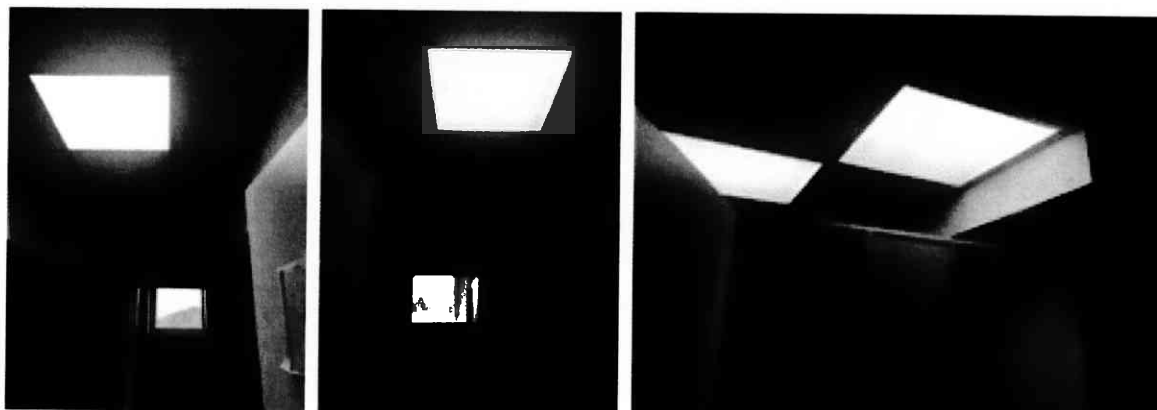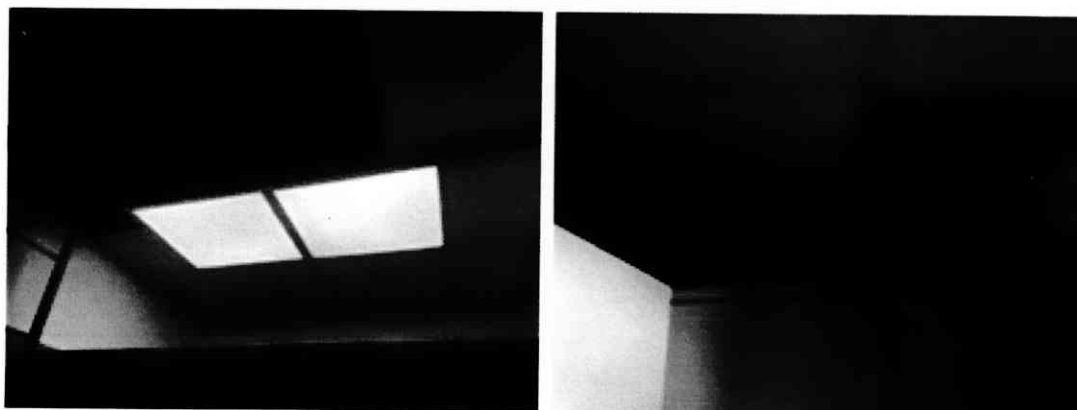

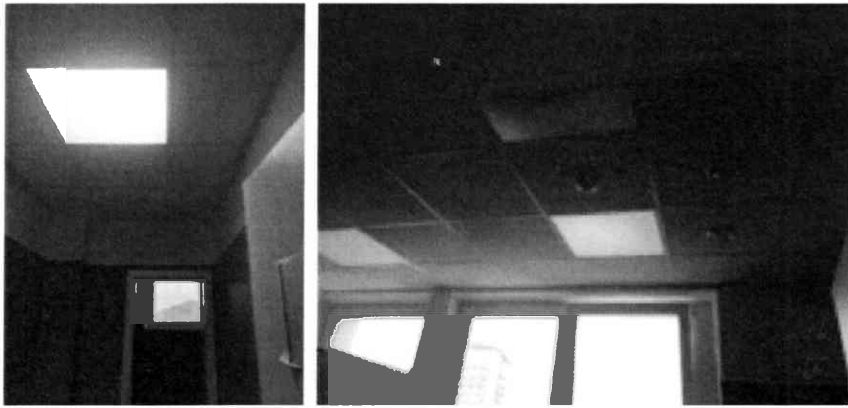

## ELZ - Evidenčný list zmeny

<b>Projekt</b>	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
<b>ELZ číslo</b>	<b>06</b>	<b>Zmluva o dielo</b>	
<b>Objednávateľ</b>	PKV	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Silvia Némethová
<b>TDI</b>	Pallas s.r.o.,	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Patrik Palaj
<b>Projektant</b>	EXPO LINE s.r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Soňa Borsová
<b>Zhotoviteľ</b>	Milanko spol. s r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Miroslav Vilík
<b>Predmet zmeny</b>	Oprava ostenia otvorov		
<b>Stavebný objekt, miesto</b>	Všetky priestory		
<b>Žiadosť o zmenu vznesol</b>	a) Zhotoviteľ		
<b>Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)</b>	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
<b>Odkaz na inú časť ZoD</b>			
<b>Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)</b>	Vytvorenie požadovaného tvaru, rozmeru dverného otvoru		
<b>Vyjadrenie projektanta</b>	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa</b>	Zhotoviteľ požaduje uhradiť navyše práce spojené s vytvorením požadovaného dverného otvoru po prevedení búracích prác ( vybúraní zárubní). Zárubne sú zaliate v betónovej malte a po vybúraní zostáva otvor nerovnomerný , nesúdržný. Úprava výšky je určujúca či je zárubni bet. zálievka alebo je tehla vložená rovno v zárubni.		
<b>Vyjadrenie TDI</b>			
<b>Vyjadrenie zástupcu investora</b>			

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Časové hodnotenie	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie
Dopad do zmluvných termínov	Naviac práca nemala vplyv na zmluvné termíny
Položkový rozpis nákladov	viď príloha č. 1
Celkové náklady zmeny bez DPH	6669,79 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

Zhotoviteľ	VILK	Podpis	Dátum
Projektant	BORSOVÁ	Podpis	Dátum
TDI		Podpis	Dátum
Objednávateľ		Podpis	Dátum

### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová  
Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík

### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
PD – projektová dokumentácia  
ZL – zmenový list  
ELZ – evidenčný list zmeny  
ZoD – zmluva o dielo  
TDI – technický dozor investora  
J.C. – jednotková cena  
SO – stavebný objekt  
AD – autorský dozor



Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac / zriadenie ostenia dverí

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves  
 Spracovali: Šteinerová  
 Projektant:  
 Ks:  
 Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves  
 Dátum:  
 Zákazka Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac  
 Objekt . zriadenie ostenia dverí

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1/A 1	342000000	pridebnenie otvoru	m2	94,500	29,50	0,00	2 787,75	0,050	4,725	
1/A 1	342000000	domurovanie otvoru	ks	63,000	18,30	0,00	1 152,90	0,045	2,835	
1/A 1	342000000	zaomietnutie otvoru z troch strán 0,2 x 0,13 x0,13 x (2+0,7+2)x63	m2	136,020	12,35	0,00	1 679,85	0,045	6,121	
1/A 1	342000000	úprava výšky otvoru	ks	63,000	10,80	0,00	680,40	0,045	2,835	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 940,65	0,00	6 300,90		7,560	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	952901111	Vyčistenie priestorov	kpl	1,000	110,00	0,00	110,00	0,000	0	
1/A 1	999000000	dopravné náklady	kpl	1,000	200,00	0,00	200,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			310,00	0,00	310,00		0,000	0
99		PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	7,560	7,79	0,00	58,89		0	
99		PRESUNY HMŔT			58,89	0,00	58,89		0,000	0
		Práce HSV			5 489,67	0,00	6 669,79		12,040	0
		Celkom v EUR			5 489,67	0,00	6 669,79		12,040	0

06 F\_ Zriadenie otvoru dvier

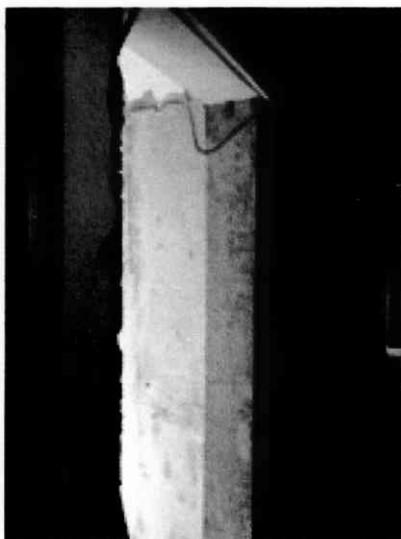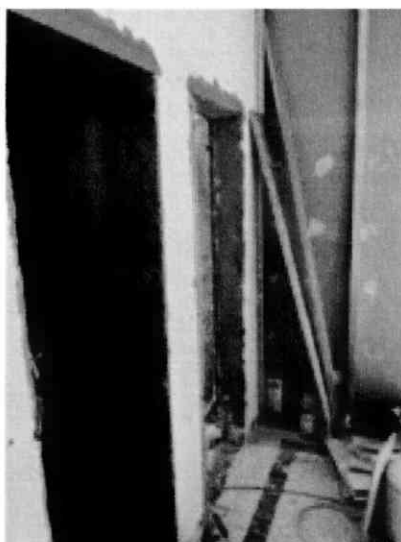





**ELZ - Evidenčný list zmeny**

<b>Projekt</b>	<b>Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení</b>		
<b>ELZ číslo</b>	<b>07</b>	<b>Zmluva o dielo</b>	
<b>Objednávateľ</b>	PKV	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Silvia Némethová
<b>TDI</b>	Pallas s.r.o.,	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Patrik Palaj
<b>Projektant</b>	EXPO LINE s.r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Soňa Borsová
<b>Zhotoviteľ</b>	Milanko spol. s r.o.	<b>Zodpovedný</b>	Ing. Miroslav Vilík
<b>Predmet zmeny</b>	Šachtová stena		
<b>Stavebný objekt, miesto</b>	Miestnosť 1.05,2.05,3.05,4.05,5.05		
<b>Žiadosť o zmenu vznesol</b>	Investor		
<b>Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)</b>	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
<b>Odkaz na inú časť ZoD</b>			
<b>Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)</b>	Nepredvídaná práca + navyše práce		
<b>Vyjadrenie projektanta</b>	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa</b>	Zhotoviteľ požaduje uhradiť navyše práce spojené s nepredvídanou prácou - vybúranie zadnej steny na demontáž rozvodov v hlavnej šachte . Po dodaní nového požiarneho projektu investorom bolo nutné túto stenu späť vymurovať.		
<b>Vyjadrenie TDI</b>			
<b>Vyjadrenie zástupcu investora</b>			
<b>Časové hodnotenie</b>	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie		

## ELZ - Evidenčný list zmeny

<b>Dopad do zmluvných termínov</b>	Naviac práca má vplyv na zmluvný termín cca 2 týždeň
<b>Položkový rozpis nákladov</b>	viď príloha č. 1
<b>Celkové náklady zmeny bez DPH</b>	3876,53 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

<b>Zhotoviteľ</b>	VILK	<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>Projektant</b>	BORSOVÁ	<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>TDI</b>		<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>Objednávateľ</b>		<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>

### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
 PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
 EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová  
 Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík

### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
 PD – projektová dokumentácia  
 ZL – zmenový list  
 ELZ – evidenčný list zmeny  
 ZoD – zmluva o dielo  
 TDI – technický dozor investora  
 J.C. – jednotková cena  
 SO – stavebný objekt  
 AD – autorský dozor



Rozpočet Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - navyše - šachtová stena / šachtová stena

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	962031133	Búranie priecok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	M2	49,140	3,10	0,00	152,33	0,001	0,033	12,826
1/A 1	979000000	sťažený presun sutiny a vyburaných hmôt	kpl	1,000	200,00	0,00	200,00		0	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	3,53	0,00	0,00	0,002	0	
1/A 1	999000000	dopravné náklady	kpl	1,000	200,00	0,00	200,00		0	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,076	7,98	0,00	104,35		0	
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	39,228	5,59	0,00	219,28		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	13,076	11,85	0,00	154,95		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	261,520	0,41	0,00	107,22		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	13,076	8,05	0,00	105,26		0	
1/A 1	979131409	poplatok za skládku	t	13,076	27,02	0,00	353,31		0	
11/A 1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - šachty od stavebnej sute pri realizácii objektu	m3	1,100	45,00	0,00	49,50		0	
11/A 1	952901111	Vyčistenie priestoru po buracích prácach	m2	68,100	3,55	0,00	241,76	0,000	0,003	
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>1 887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887,96</b>		<b>0,040</b>	<b>12,83</b>
	99	<b>PRESUNY HMÔT</b>								
11/A 1	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	6,622	7,42	0,00	49,14		0	
	99	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>49,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>3 231,53</b>	<b>55,00</b>	<b>3 286,53</b>		<b>5,660</b>	<b>12,83</b>
		<b>Práce PSV</b>								
767		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
P/PC	767000000	M+D - dvere EI 30 min. + kovanie	ks	1,000	0,00	590,00	590,00		0	
	767	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>


Rozpočet Poliklinika Kačava Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac - šachtová stena / šachtová stena

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			3 231,53	645,00	3 876,53		5,660	12,83

07F\_ Šachtová stena



Šachtová stena 5np

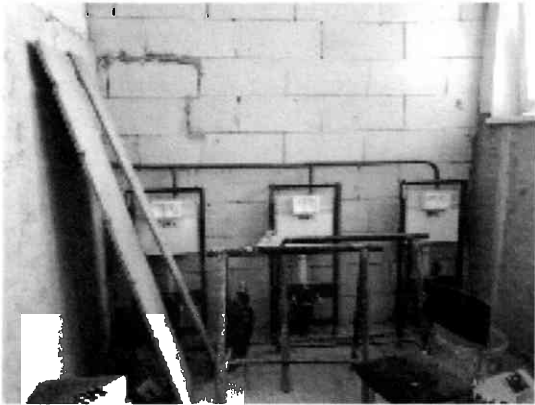

Šachtová stena 4np



Šachtová stena 3np



Šachtová stena 2np



Šachtová stena 1np



Čistenie šachty



Čistenie šachty1



Čistenie šachty2

Doplniť foto z 1pp

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Projekt	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
ELZ číslo	<b>08</b>	Zmluva o dielo	
Objednávateľ	PKV	Zodpovedný	Ing. Silvia Némethová
TDI	Pallas s.r.o.,	Zodpovedný	Ing. Patrik Palaj
Projektant	EXPO LINE s.r.o.	Zodpovedný	Ing. Soňa Borsová
Zhotoviteľ	Milanko spol. s r.o.	Zodpovedný	Ing. Miroslav Vilík
Predmet zmeny	Automatické dvere (D42,43)		
Stavebný objekt, miesto	Vstup do budovy		
Žiadosť o zmenu vznikla	a) Zhotoviteľ b) Investor		
Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
Odkaz na inú časť ZoD			
Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)	Nepredvídaná práca + navyše práce		
Vyjadrenie projektanta	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
Vyjadrenie zhotoviteľa	Zhotoviteľ požaduje uhradiť navyše práce spojené s požiadavkou investora - 1) opatriť hlavné vstupné dvere systémom na odblokovanie z vonku (D43) 2) interiérové automatické dvere (D42 )z dôvodu zasahovania do priestoru šachty a hydrantovej skrine kde nie je možné vybudovať pevný uchytý bod musia byť zmenené na jednostrane posuvné zároveň sa musí vybudovať pomocná oceľová konštrukcia , ktorá umožní uchytenie celého portálu dvier(OK nebola predmetom zadania)		
Vyjadrenie TDI			
Vyjadrenie zástupcu investora			

## ELZ - Evidenčný list zmeny

<b>Časové hodnotenie</b>	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie
<b>Dopad do zmluvných termínov</b>	Naviac práca nemala vplyv na zmluvné termíny
<b>Položkový rozpis nákladov</b>	viď príloha č. 1
<b>Celkové náklady zmeny bez DPH</b>	1111,56 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

<b>Zhotoviteľ</b>	VILK	<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>Projektant</b>	BORSOVÁ	<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>TDI</b>		<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>
<b>Objednávateľ</b>		<b>Podpis</b>	<b>Dátum</b>

### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
 PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
 EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová  
 Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík

#### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
 PD – projektová dokumentácia  
 ZL – zmenový list  
 ELZ – evidenčný list zmeny  
 ZoD – zmluva o dielo  
 TDI – technický dozor investora  
 J.C. – jednotková cena  
 SO – stavebný objekt  
 AD – autorský dozor

# Rožpočet Polikliniky Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac / automatické dvere

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves

Spracoval: Šteinerová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac

Objekt automatické dvere

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
1/A	1	Zmena systému dvier	kpl	1,000	346,00	0,00	346,00		0	
1/A	1	M + D - vonkajšie ovládanie - hlavné vstupné dvere	ks	1,000	94,80	0,00	94,80		0	
1/A	1	Demontáž a úprava priestoru nad portálom	kpl	1,000	250,00	0,00	250,00		0	
1/A	1	Olištovanie obvodu	m	6,400	21,30	0,00	136,32		0	
1/A	1	Vytvorenie zatepleného nadpražia 2x2, Nobasil	m2	4,000	59,80	0,00	239,20		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 066,32	0,00	1 066,32		0,000	0
		Práce HSV			1 066,32	0,00	1 066,32		0,000	0
		Práce PSV								
763		DREVOSTAVBY								
763	763000000	M+D - SDK blenda jednostranná 3,40x0,37 m	m2	1,300	34,80	0,00	45,24		0	
	763	DREVOSTAVBY			45,24	0,00	45,24		0,000	0
		Práce PSV			45,24	0,00	45,24		0,000	0
		Celkom v EUR			1 111,56	0,00	1 111,56		0,000	0

**Rozpočet Polikliniky - Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac / automatické dvere**

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves

Spracovali: Šteinerová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac

Objekt automatické dvere

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
1/A 1	999000000	Zmena systému dvier	kpl	1,000	346,00	0,00	346,00		0	
1/A 1	999000000	M + D - vonkajšie ovládanie - hlavné vstupné dvere	ks	1,000	94,80	0,00	94,80		0	
1/A 1	999000000	Demontáž a úprava priestoru nad portálom	kpl	1,000	250,00	0,00	250,00		0	
1/A 1	999000000	Olišovanie obvodu	m	6,400	21,30	0,00	136,32		0	
1/A 1	999000000	Výtvorenie zatepleného nadpražia 2x2, Nobasil	m2	4,000	59,80	0,00	239,20		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 066,32	0,00	1 066,32		0,000	0
		Práce HSV			1 066,32	0,00	1 066,32		0,000	0
		Práce PSV								
763		DREVOSTAVBY								
763	763000000	M+D - SDK biela jednostranná 3,40x0,37 m	m2	1,300	34,80	0,00	45,24		0	
763		DREVOSTAVBY			45,24	0,00	45,24		0,000	0
		Práce PSV			45,24	0,00	45,24		0,000	0
		Celkom v EUR			1 111,56	0,00	1 111,56		0,000	0

8 F \_ Automatické posuvné dvere



Stav priestoru v mieste dvier





Stav priestoru v mieste dvier



Poloha portálu a dvier pri otvorení podľa pôvodného projektu



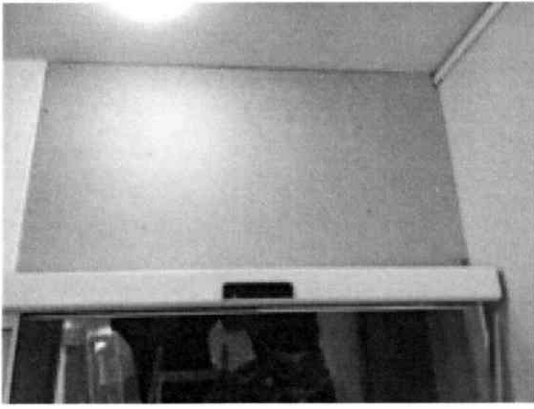

## ELZ - Evidenčný list zmeny



Projekt	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
ELZ číslo	<b>09</b>	Zmluva o dielo	
Objednávateľ	PKV	Zodpovedný	Ing. Silvia Némethová
TDI	Pallas s.r.o.,	Zodpovedný	Ing. Patrik Palaj
Projektant	EXPO LINE s.r.o.	Zodpovedný	Ing. Soňa Borsová
Zhotoviteľ	Milanko spol. s r.o.	Zodpovedný	Ing. Miroslav Vilík
<b>Predmet zmeny</b>		Požiarne klapky	
<b>Stavebný objekt, miesto</b>		Strojovňa VZT	
<b>Žiadosť o zmenu vzniesol</b>		Investor	
<b>Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)</b>		Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.	
<b>Odkaz na inú časť ZoD</b>			
<b>Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)</b>		Nepredvídaná práca + navyše práce	
<b>Vyjadrenie projektanta</b>		S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.	
<b>Vyjadrenie zhotoviteľa</b>		Zhotoviteľ požaduje uhradiť navyše práce spojené s požiadavkou investora a novým projektom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby	
<b>Vyjadrenie TDI</b>			
<b>Vyjadrenie zástupcu investora</b>			
<b>Časové hodnotenie</b>		Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie	

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Dopad do zmluvných termínov	Naviac práca má vplyv na zmluvný termín
Položkový rozpis nákladov	viď príloha č. 1
Celkové náklady zmeny bez DPH	3 088,30 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	

### Potvrdenie zmeny

Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.

Zhotoviteľ		Podpis	Dátum
Projektant		Podpis	Dátum
TDI		Podpis	Dátum
Objednávateľ		Podpis	Dátum

### Rozdeľovník

PKV, Ing. Silvia Némethová  
PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj  
EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová  
Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilík



### Použité skratky

VV – výkaz výmer  
PD – projektová dokumentácia  
ZL – zmenový list  
ELZ – evidenčný list zmeny  
ZoD – zmluva o dielo  
TDI – technický dozor investora  
J.C. – jednotková cena  
SO – stavebný objekt  
AD – autorský dozor

**Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - navyiac práca - VZT úprava trasovania s doplnením požiarneho klapiek**

Odberteľ: Poliklinika Karlova Ves		Spracoval: Šteinerová								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves		Dátum: 28. 10. 2020								
Zákazka Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - navyiac - VZT										
Objekt VZT - Zariadenie č.1 - úprava trasovania s doplnením požiarneho klapiek - 5. NP a strojovňa										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
1/A	1	Stavebné úpravy v miestnosti VZT - M+D - výmena výplni	ks	2,000	129,30	0,00	258,60		0	
	9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>258,60</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Práce HSV			<b>258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>258,60</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Montážne práce								
	924	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>								
P/PC	9240000000	M+D - požiarne klapka FDS-3G-550x300-H0	ks	1,000	0,00	302,65	302,65		0	
P/PC	9240000000	M+D - príložka pre FDS CBS-FD-550x300	ks	1,000	0,00	209,20	209,20		0	
P/PC	9240000000	M+D - požiarne klapka FDS-3G-550x200-H0	ks	1,000	0,00	282,05	282,05		0	
P/PC	9240000000	M+D - príložka pre FDS CBS-FD-550x200	ks	1,000	0,00	189,40	189,40		0	
P/PC	9240000000	M+D - vytvorenie atypického požiarneho prechodu cez strop	ks	2,000	0,00	118,20	236,40		0	
P/PC	9240000000	M+D - výroba atypického potrubia	ks	11,000	0,00	63,20	695,20		0	
P/PC	9240000000	M+D - plných okenných výplni + úprava pre prestup, demontáž výplni okien	ks	2,000	0,00	57,40	114,80		0	
P/PC	9240000000	M+D - objímky,závěsy,montažný materiál	kg	2,000	0,00	60,00	120,00		0	
924	9240000000	Vyregulovanie systémov	hod	2,000	30,00	0,00	60,00		0	
924	9240000000	Ostatné montážne a prípravne práce	hod	16,000	25,00	0,00	400,00		0	
924	9240000000	Náklady spojené s výmenou	kpl	1,000	120,00	0,00	120,00		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
924	924000000	Dopravné náklady	kpl	1,000	100,00	0,00	100,00		0	
	924	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>			<b>680,00</b>	<b>2 149,70</b>	<b>2 829,70</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>			<b>680,00</b>	<b>2 149,70</b>	<b>2 829,70</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>938,60</b>	<b>2 149,70</b>	<b>3 088,30</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Menej práce,dodávky</b>								
P/PC	924000000	požiarna klapka PKIR3G-250-ZV-utesnenie medzery medzi požiarnou deliacou stenou a požiarnou klapkou podľa pokynov výrobcu	ks	- 2,000		130,00	- 260,00		0	
P/PC	924000000	Montáž klapky	ks	- 2,000		20,00	- 40,00		0	
	<b>Spolu</b>						<b>- 300,00</b>			

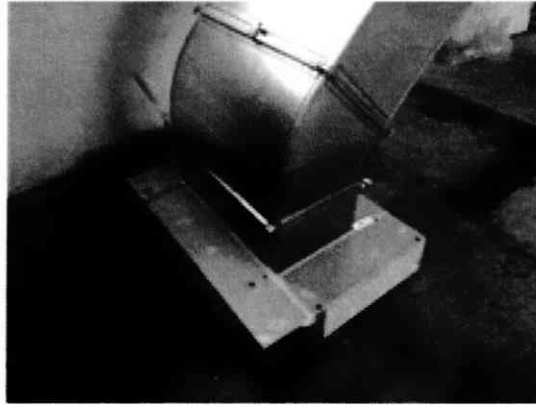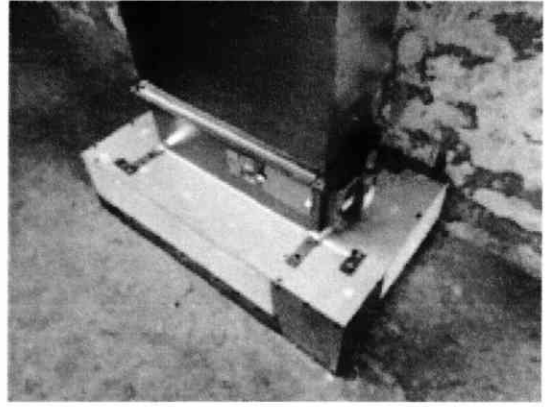

## ELZ - Evidenčný list zmeny

Projekt	Poliklinika KARLOVA VES , Rekonštrukcia sociálnych zariadení		
ELZ číslo	<b>10</b>	Zmluva o dielo	
Objednávateľ	PKV	Zodpovedný	Ing. Silvia Némethová
TDI	Pallas s.r.o.,	Zodpovedný	Ing. Patrik Palaj
Projektant	EXPO LINE s.r.o.	Zodpovedný	Ing. Soňa Borsová
Zhotoviteľ	Milanko spol. s r.o.	Zodpovedný	Ing. Miroslav Vilík
Predmet zmeny	Podchytenie otvoru		
Stavebný objekt, miesto	1pp – miestnosť č.0.09		
Žiadosť o zmenu vznikla	Zhotoviteľ		
Technická špecifikácia a odkazy na výkresy (projektovú dokumentáciu)	Tento rozsah prác, predložená PD neriešila.		
Odkaz na inú časť ZoD			
Dôvod zmeny (zmena zapríčinená zmenou položky, kvality, rozmerov, termínov či dodatočné tzv. navyše práce)/ neprevedené práce tzv. menej práce, chyba projektu, chyba VV)	Nepredvídaná práca + navyše práce		
Vyjadrenie projektanta	S navrhnutou zmenou po vzájomnej dohode na KD súhlasím za predpokladu, že budú dodržané všetky technologické postupy dodaných výrobkov a materiálov.		
Vyjadrenie zhotoviteľa	Zhotoviteľ požaduje uhradiť navyše práce spojené s realizáciou prác vm.č.0.09 , 1pp – rozšírenie otvoru. Pri realizácii búracích prác bolo zistené , že stena sociálneho zázemia je súčasťou betónového skeletu (odlievaný betón)		
Vyjadrenie TDI			
Vyjadrenie zástupcu investora			

## ELZ - Evidenčný list zmeny

<b>Časové hodnotenie</b>	Zhotoviteľ v návrhu ZL neuviedol časové hodnotenie
<b>Dopad do zmluvných termínov</b>	Naviac práca má vplyv na zmluvný termín
<b>Položkový rozpis nákladov</b>	vid' príloha č. 1
<b>Celkové náklady zmeny bez DPH</b>	814,37 €
<b>Prílohy:</b> č.1_01 ZL č.2_01 R_ č.3_01 F_ Strecha	

<b>Potvrdenie zmeny</b>			
Potvrdenie zmeny oprávňuje Zhotoviteľa k prevedeniu zmeny v rozsahu vyššie uvedenom a v súlade so Zmluvou o Dielo.			
Zhotoviteľ	VILK	Podpis	Dátum
Projektant	BORSOVÁ	Podpis	Dátum
TDI		Podpis	Dátum
Objednávateľ		Podpis	Dátum

<b>Rozdeľovník</b> PKV, Ing. Silvia Némethová PALLAS s.r.o., Ing. Patrik Pálaj EXPO LINE s.r.o., Ing. Soňa Borsová Milanko, spol. s r.o.: Ing. Miroslav Vilik
<b>Použité skratky</b> VV – výkaz výmer PD – projektová dokumentácia ZL – zmenový list ELZ – evidenčný list zmeny ZoD – zmluva o dielo TDI – technický dozor investora J.C. – jednotková cena SO – stavebný objekt AD – autorský dozor

**Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac - podchytienie otvoru 1.PP**

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves

Spracoval: Šteinerová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Dátum: 28. 10. 2020

Zákazka Poliklinika Karlova Ves - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - naviac - podchytienie otvoru 1.PP

Objekt podchytienie otvoru 1.PP

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	974032878	Vytváranie - vysekanie drážok ručným drážkovačom	m	6,000	10,97	0,00	65,82		0	0,015
13/B 1	974000000	Oprava dražky - presieťkovanie + omietka	m2	2,000	16,80	0,00	33,60		0	
13/B 1	971042551	Vybúranie - vyrezanie otvoru 2,50 m v betóne hr. 200 mm	kpl	1,000	240,00	0,00	240,00		0	0,550
11/A 1	952901111	Vyčistenie priestorov po stavebných prácach	kpl	1,000	100,00	0,00	100,00	0,000	0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,565	11,85	0,00	6,70		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,300	0,41	0,00	4,63		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,565	8,05	0,00	4,55		0	
1/A 1	979131409	poplatok za skládku	t	0,565	27,02	0,00	15,27		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			470,57	0,00	470,57		0,000	0,57
		Práce HSV			470,57	0,00	470,57		0,000	0,57
		Práce PSV								
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101	Montáž + dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii	kg	27,000	9,00	0,00	243,00	0,000	0,002	
767	767000000	M+D - svorník M18	ks	9,000	11,20	0,00	100,80		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			343,80	0,00	343,80		0,000	0
		Práce PSV			343,80	0,00	343,80		0,000	0

Poliklinika Karlo Ves - Rekonštrukcia socialnych zariadení - naviac - pr - chytenie otvoru 1.PP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			814,37	0,00	814,37		0,000	0,57



